

Gegeneerd: 25-09-20

Project: LMS P53 112 App

Code: 10.2.g

Rapportageperiode

01-08-2020

t/m

31-08-2020

Opdrachtgever:

Start- / Einddatum project

01-06-2020

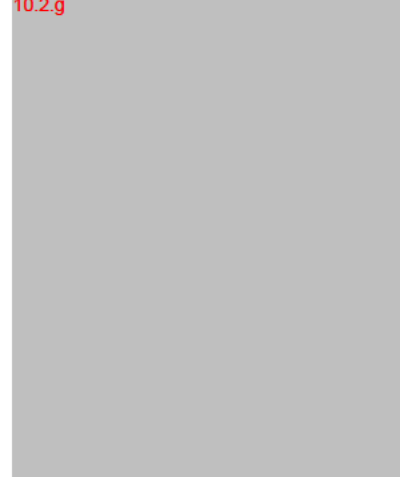
t/m

30-11-2020

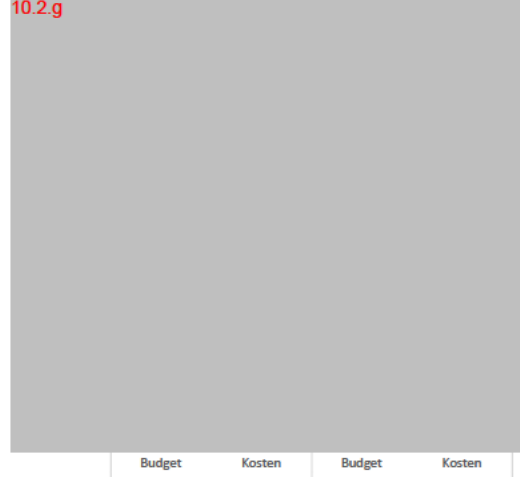
 Projectleider/
 manager:

10.2.e

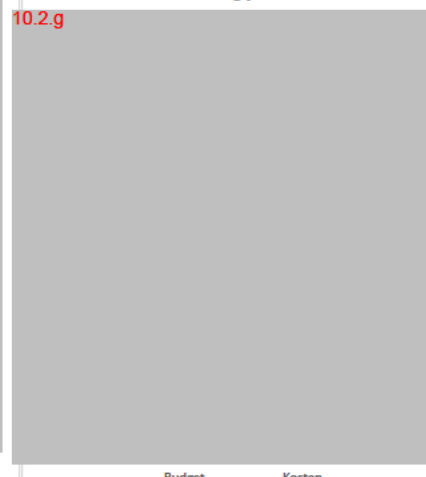
Gegevens uit het financieel grid

 Financiën totale project
 10.2.g


Budget Besteed Nog te besteden

 Financiën per categorie
 10.2.g

 Budget Kosten Budget Kosten
 MDC Kosten Materieel MDC Kosten Personeel

Budget Besteed Nog te besteden

 Financiën totaal huidig jaar
 10.2.g


Budget Kosten

Budget Besteed Nog te besteden

Producten opgeleverd deze rapportageperiode

Fase	Naam	Eigenaar	Start gepland	Opgeleverd gepland	Opgeleverd werkelijk	Opmerking
Uitvoeringsfase 1	D3: Change GMS en GMS Webservice		15-06-2020	10-07-2020	21-08-2020	

Producten op te leveren komende rapportageperiode

Fase	Naam	Eigenaar	Start gepland	Opgeleverd gepland	Opmerking
Uitvoeringsfase 1	D13: Functiepunten-analyse 112App Backend		13-07-2020	04-09-2020	
Uitvoeringsfase 1	D17/3.4 Release GMS Webservice		13-07-2020	04-09-2020	
Uitvoeringsfase 1	D12: 112AppKeten op Acceptatie (1 t/m 4)		10-08-2020	04-09-2020	
Uitvoeringsfase 1	D16: 112Beheer		10-08-2020	04-09-2020	
Uitvoeringsfase 1	D14 Protocol van Oplevering (MDC)		13-07-2020	04-09-2020	

Producten te laat

Fase	Naam	Eigenaar	Start gepland	Opgeleverd gepland	Opmerking
Uitvoeringsfase 1	Contracten met Leveranciers 10.2.g		29-06-2020	10-07-2020	
Uitvoeringsfase 1	D10 Testplan		13-07-2020	07-08-2020	
Uitvoeringsfase 1	D2: 112 KetenArchitectuur		01-06-2020	12-06-2020	
Uitvoeringsfase 1	D3: HLD 112App		15-06-2020	10-07-2020	
Uitvoeringsfase 1	D3: HLD 112App Backend		15-06-2020	10-07-2020	
Uitvoeringsfase 1	D9: OTAP-inrichting 112AppBackend gereed		13-07-2020	07-08-2020	

Producten te laat, wel opgeleverd in komende rapportageperiode

Fase	Naam	Eigenaar	Start gepland	Opgeleverd gepland	Opmerking
Uitvoeringsfase 1	D11 / 4.1 : Functionele Eisen		13-07-2020	07-08-2020	

Statusomschrijving:

Budget toegewezen gekregen voor 4 extra sprints.

Bouw in uitvoering door leverancier 10.2.g voor GMS fase 1

Bouw in uitvoering door 10.2.g voor 112App en Backend.

Afspraken definitief gemaakt met KPN t.a.v. oplevering BR3 (Afstemming inhoud BR4 volgt later). Oplevering voor vrijgave nog steeds gepland voor begin december
Coördinator beschikbaar gesteld gekregen voor coördinatie In Beheer Name.

Afspraken gemaakt voor diverse Privacy-toetsen en Security-toetsen (w.o. PEN-testen met KPMG)

Risico's en Maatregelen worden samen met de Stuurgroep besproken, en maatregelen worden, voor zover mogelijk, getroffen.

Waaronder dreiging ontbinding 10.2.g

Komende maand:

Bouw 112APP en Backend 112APP (vervolg), GMS (vervolg) en D112 (start)

Vervolg oplevering werkinstructies en opleidingsmateriaal

Start testen van afzonderlijke opleveringen.

Maken van plannen en afspraken t.b.v. realisatie en beheer 112APP en 112APP-Backend ná 31-12-2020.

Corrigerende maatregel:**Toelichting:****Issues (openstaande, hoge Prio)**

Nr	Omschrijving	Product / Planning-item	Type	Eigenaar	Opmerkingen
----	--------------	-------------------------	------	----------	-------------

Risico's

Nr	Omschrijving	Product / Planning-item	Kans	Impact	Eigenaar	Opmerkingen
14	Tijdige oplevering Mediaserver	--	Groot	Gemiddeld	10.2.e	
13	Continuïteit inzet na 31-12-2020	--	Zeer groot	Groot	10.2.e	
4	Live brengen 112App keten lastig door verschillend ritme release-schemas DO112, GMS en	Uitvoeringsfase 1	Zeer groot	Gemiddeld		Scope voor GMS beperkt tot fase 1 (Berichtenverkeer)
2	Buss Release 3 Dienst 1-1-2 niet tijdig opgeleverd	Werkpakket D112	Groot	Gemiddeld	10.2.e	BR wordt door KPN begin december aangeboden tbv livegang Inhoud Business Release 3 beperkt (excl. autom. Doorrouteren) Afspraken met KPN gemaakt om oplevertijd te beperken. Ketentest zal in oktober plaatsvinden, voorafgaand aan oplevering eind november 2020
