



# Ontwikkeling Digitaal Logboek Stalking

Overzicht gemaakte afspraken

30 januari 2019

# Politie en Justitie willen slachtoffers van stalking helpen bij het vastleggen van bewijs door de mogelijkheid te geven een digitaal logboek stalking bij te houden in de Politie App

## Huidige situatie

- Geen vast format voor het aanleggen van een logboek
- Onduidelijk voor slachtoffer welke informatie bijgehouden moet worden
- Inhoud logboek afhankelijk van perceptie burger
- Groot verschil in kwaliteit bij de door de burger opgebouwde en aangeleverde logboeken

## Wens

- Een digitaal logboek aanbieden die relevante informatie uitvraagt, registreert en overdraagt
- Dit op een zo gebruiksvriendelijk en veilig mogelijke manier doet, conform beleid Nationale Politie
- Oplevering uiterlijk eind Q2 2019
- Ontwikkeling vindt plaats bij het DevOps team in dienst van programma NMDD te Zeist
- Bij oplevering is de app getest en gereed om beschikbaar te worden gesteld in de App Stores
- Onderhoud van de app wordt verzorgd door het programma NMDD


## Functionele eisen

- Registratieveld voor algemene (verdachte)gegevens  
-> Aandacht voor verschillende soorten stalkers
- Registratieveld incident specifieke gegevens  
-> Dag / datum / tijdstip / locatie / soort incident / beschrijving / getuigen en tijdstip
- Uploadmogelijkheid voor digitale bijlagen  
-> Foto / screenshot / video / geluidsfragment / document
- Overdrachtsfunctie voor gegevens  
-> Minimaal handmatig in pdf formaat. Indien infrastructuur politie dit toelaat automatisch



# Team App ontwikkelt de Politie App volgens de Agile Scrum Methodiek

30 januari 2019

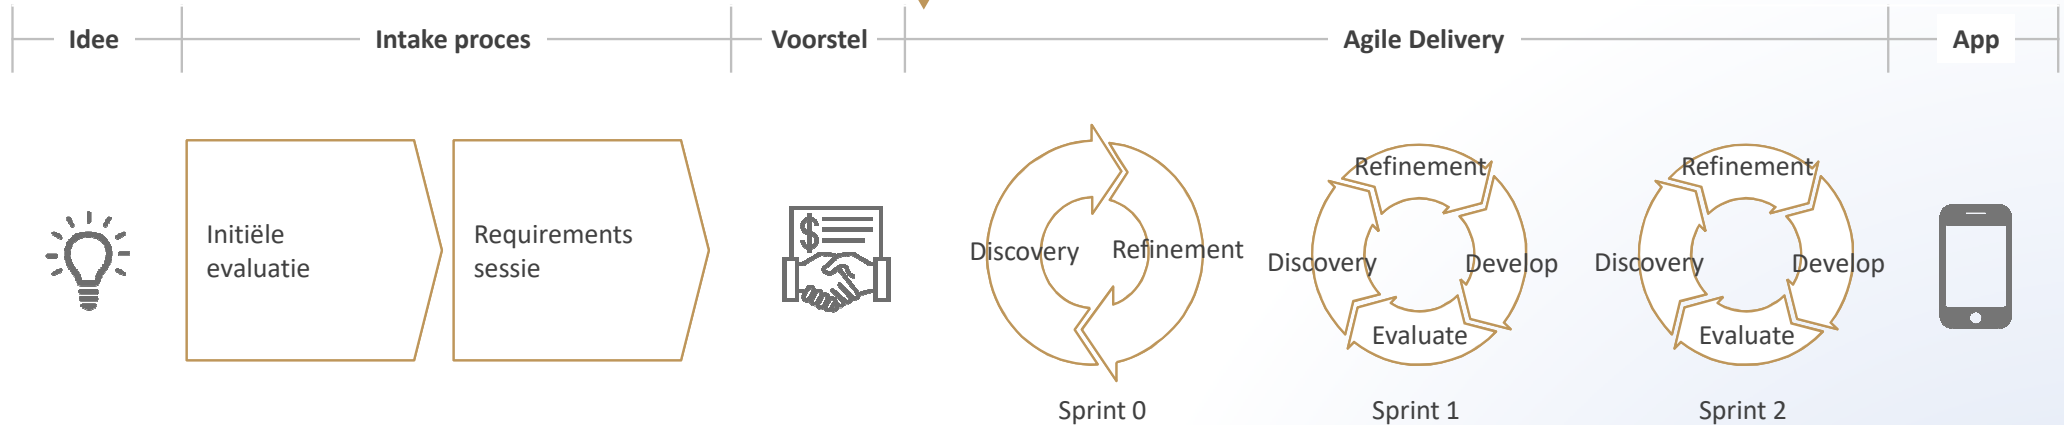

## Initiële evaluatie

- Aantoonbare business value
- Technisch haalbaar
- Business owner beschikbaar
- Past binnen core business van de productlijn
- Budget of akkoord van MT aanwezig
- Akkoord met ways of working van het team

## Requirements sessie

- Functionele epics
- Technische requirements

## Agile Delivery – Start 19 maart 2019

- Er worden “native” applicaties gebouwd
- Er is één Product Owner met daarnaast een Product Line Manager
- Er worden sprints van 2 weken gehanteerd
- Aan het einde van elke sprint volgt een demo waar stakeholders voor worden uitgenodigd
- Iteratief ontwikkelen van de gevraagde functionaliteit, met ingebouwde feedbackloop, om tweewekelijks te kunnen blijven sturen op kwaliteit en waarde oplevering

# Agile ontwikkeling vereist commitment van zowel klant als bouwteam

## Commitment vanuit het team

Wat	
Inschatting team velocity	70 Story Points per sprint
Visuele designs 'digitaal logboek stalking'	Discovery fase
Inschatting StoryPoints per user story	Tijdens refinement
Inschatting totaal aantal Storypoints voor 'digitaal logboek stalking'	Xx Story Points *
2 wekelijkse demo van de ontwikkelingen	Sprint Demo

\* 140 Story Points worden gefinancierd vanuit het budget beschikbaar gesteld door het Innovatieteam van het Ministerie van Justitie & Veiligheid

## Commitment vanuit de klant

Wat	
Opstellen userstories	Business Owner
Vaststellen of visuele designs 'digitaal logboek stalking' voldoen aan wensen	Business Owner
Aanwezigheid bij 2 wekelijkse sprint demo	Innovatieteam J&V
Feedback op voortgang tijdens sprint demo	Innovatieteam J&V

## Per sprint zal de voortgang worden gerapporteerd middels een sprintrapportage

<b>SAMENVATTING SPRINT x STALKING:</b> 19-3-2019 – 1-4-2019
In sprint x waren de belangrijkste doelstellingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verder ontwikkelen <b>'Digitaal Logboek Stalking'</b></li> <li>• Analytics toevoegen aan app</li> <li>• Bijwerken Privacy Statement</li> </ul>
Livegangen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen</li> </ul>
Velocity: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 70 punten gepland / 67 punten opgeleverd</li> <li>• Toelichting: Wegens stroomstoring kon er 1 dag minder gewerkt worden</li> </ul>

TOP 3 RISICO'S	MITIGATIE
Connectie achterlandschap	Tot 25-3 ontwikkelen we verder op dummy achterlandschap
Nieuwe versie iOS (v13)	Per 22 maart kunnen we al testen op de nieuwe versie
Etc.	

IN SPRINT	JIRA KEY	PLATFORM	OMSCHRIJVING	TYPE	STORY POINTS	
✓	14120	Android & iOS	Homescreen	Nieuwe functionaliteit	13	✓
✓	14121	Android & iOS	Etc	Nieuwe functionaliteit	13	✓
✓	14122	Android & iOS	Etc	Nieuwe functionaliteit	8	✓
✓	14123	Android & iOS	Etc	Nieuwe functionaliteit	20	✓
✓	14124	Android & iOS	Etc	Nieuwe functionaliteit	8	✓
✓	14125	Android & iOS	Etc	Enabler	5	✓
✓	14126	Android & iOS	Etc	Enabler	3	✗
	14127	Android & iOS				
	14128	Android & iOS				
	14129	Android & iOS				
	14130	Android & iOS				
	14131	Android & iOS				
	14132	Android & iOS				
	14133	Android & iOS				
	14134	Android & iOS				
	14135	Android & iOS				
